


※1: 計器不良  
 ※2: テータ採取対象外

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ-  
 3月29日 14:00 現在

号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	給水ポンプを用いた淡水注入中。 流量 133l/min (3/29 8:32) 仮設計器	消火系ポンプを用いた淡水注入中。 流量 117l/min (3/28 0:12) 仮設計器	消火系ポンプを用いた淡水注入中。 流量 200l/min (3/28 20:32) 仮設計器	停止中	停止中	停止中
原子炉水位	燃料域A: -1650mm 燃料域B: -1600mm (3/29 13:00 現在)	燃料域A: -1500mm (3/29 13:00 現在)	燃料域A: -1850mm 燃料域B: -2250mm (3/29 12:00 現在)	※2	停止域 2346mm (3/29 14:00 現在)	停止域 1858mm (3/29 14:00 現在)
原子炉圧力	0.371MPa g (A) 0.491MPa g (B) (3/29 13:00 現在)	-0.025MPa g (A) -0.025MPa g (B) (3/29 13:00 現在)	0.029MPa g (A) -0.095MPa g (C) (3/29 12:00 現在)	※2	0.009MPa g (3/29 14:00 現在)	0.005MPa g (3/29 14:00 現在)
原子炉水温度	(系統流量がないため採取不可)					
原子炉圧力容器 温度	給水ノズル温度: 299.4℃ 圧力容器下部温度: 135.8℃ (3/29 13:00 現在)	給水ノズル温度: 160.5℃ 圧力容器下部温度 143.6℃ (3/29 13:00 現在)	給水ノズル温度: 62.2℃(調査中) 圧力容器下部温度: 121.1℃ (3/29 12:00 現在)	4u: 原子炉内に発熱体(燃料)なし 5,6u: 原子炉水温度にて監視中		
D/W-S/C圧力	D/W 0.265MPa abs S/C 0.265MPa abs (3/29 13:00 現在)	D/W 0.100MPa abs S/C ダウンスケール(調査中) (3/29 13:00 現在)	D/W 0.1075MPa abs S/C 0.1796MPa abs (3/29 12:00 現在)	※2		
CAMS	D/W 3.38X10 <sup>1</sup> Sv/h S/C 1.97X10 <sup>1</sup> Sv/h (3/29 13:00 現在)	D/W 4.05X10 <sup>1</sup> Sv/h S/C 1.33X10 <sup>1</sup> Sv/h (3/29 13:00 現在)	D/W 2.86X10 <sup>1</sup> Sv/h S/C 1.16X10 <sup>1</sup> Sv/h (3/29 12:00 現在)	※2		
D/W 設計使用圧力	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)	※2		
D/W 最高使用圧力	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)	※2		
使用済燃料プール	※1	46℃ (3/29 13:00 現在)	※1	※1	38.6℃ (3/29 14:00 現在)	21.5℃ (3/29 14:00 現在)
FPC 燃料サイヤ バ	4500mm (3/29 13:00 現在)	5700mm (3/29 13:00 現在)	※1	5250mm (3/29 12:00 現在)	※2	
電源	外部電源受電中 (P/C2C)					
その他情報	外部電源受電中 (P/C4D)					
	共用プール: 35℃程度 (3/28 16:10)			5u: SHCモード (3/28 11:47~)		
	6u: 非稼働 (3/28 18:06~)					
	外部電源受電中					
	3号機 原子炉圧力容器温度区について、テータ採取を行い、状況推移を継続調査中。 2号機 S/C圧力について、状況推移を継続調査中。					

圧力換算 ゲージ圧(MPa g) = 絶対圧(MPa abs) - 大気圧(標準大気圧 0.1013 MPa)  
 絶対圧(MPa abs) = ゲージ圧(MPa g) + 大気圧(標準大気圧 0.1013 MPa)


## 福島第一原子力発電所1号機の状況 (3月29日 12:00現在)

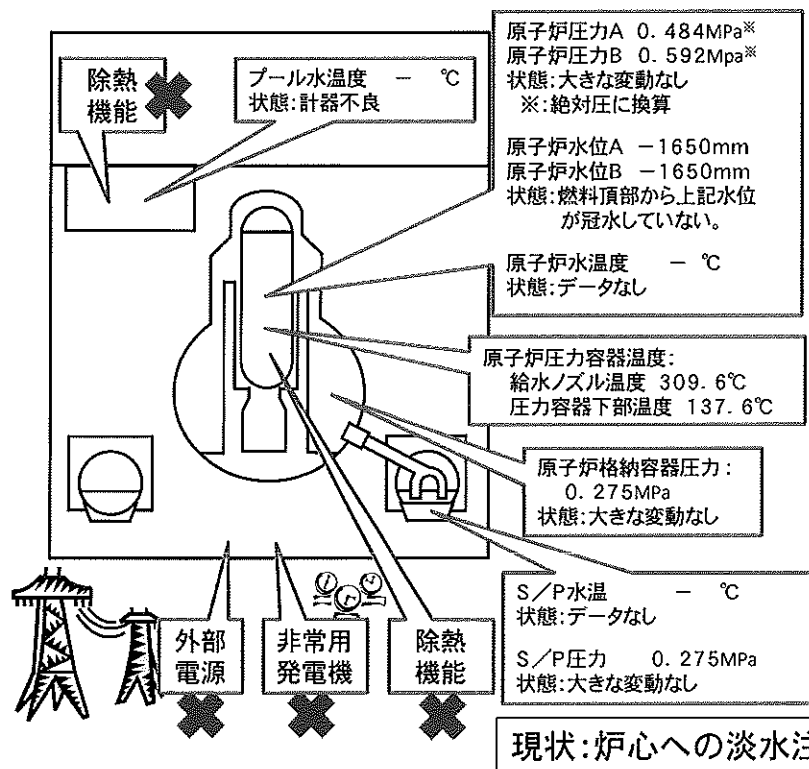

### 発生後の主要なできごと

- 11日14:46 運転中、地震により自動停止
- 11日15:42 10条通報(全交流電源喪失)
- 11日16:36 15条事象の発生  
(非常用炉心冷却装置注水不能)
- 12日01:20 15条事象の発生  
(格納容器圧力異常上昇)
- 12日10:17 ベント開始
- 12日15:36 爆発音
- 12日20:20 海水及びホウ酸の炉心注入開始
- 23日02:33 消火系に加え、給水系を使うことにより炉心への注水量を増量  
(2m³/h → 18m³/h)。9:00に給水系のみに切替(18m³/h → 11m³/h)
- 24日11:30 中央制御室の照明復帰
- 25日15:37 淡水の炉心注入開始
- 29日08:32 仮設電動ポンプでの炉心注水に切替


## 福島第一原子力発電所2号機の状況 (3月29日 12:00現在)

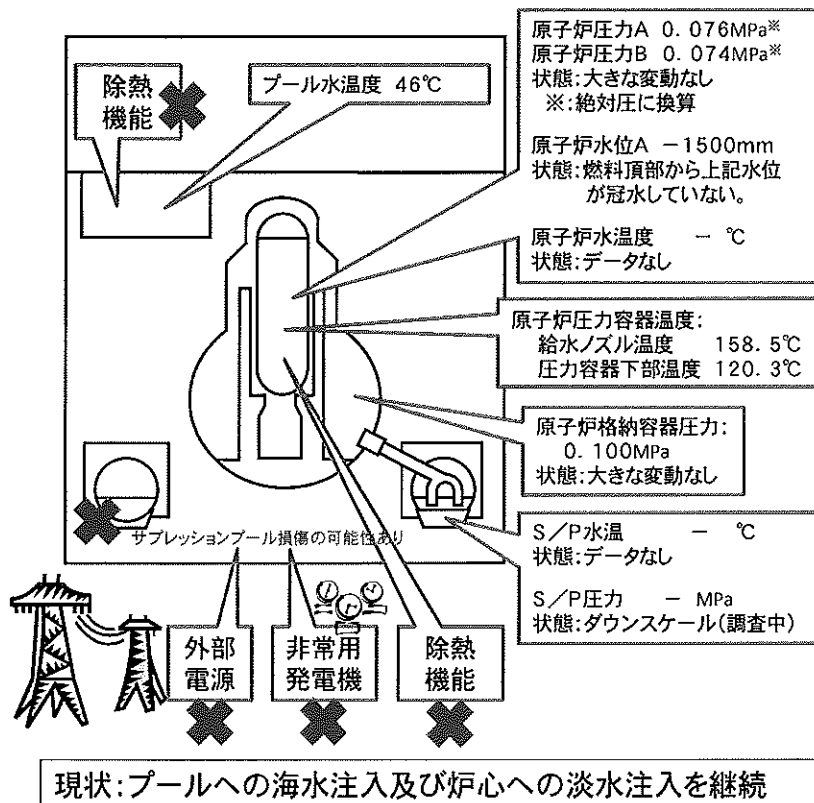

### 発生後の主要なできごと

- 11日14:46 運転中、地震により自動停止
- 11日15:42 10条通報(全交流電源喪失)
- 11日16:36 15条事象の発生  
(非常用炉心冷却装置注水不能)
- 13日11:00 ベント開始
- 14日13:25 15条事象の発生  
(原子炉心冷却機能喪失)
- 14日16:34 海水の炉心注入開始
- 14日22:50 15条事象の発生  
(格納容器圧力異常上昇)
- 15日0:02 ベント開始
- 15日06:10 爆発音発生
- 15日06:20頃 サプレッションプール(圧力抑制室)損傷の可能性あり
- 20日15:05~17:20 使用済燃料プール冷却系(FPC)から使用済燃料プール(SFP)に約40tの海水を注水
- 20日15:46 パワーセンター受電
- 21日18:22 白煙が発生。22日7:11にほとんど見えない程度に減少
- 22日16:07 SFPに約18tの海水を注水
- 25日10:30~12:19 FPCからSFPに海水を注水
- 26日10:10 淡水の炉心注入開始
- 26日16:46 中央制御室の照明復帰
- 27日18:31 仮設電動ポンプでの炉心注水に切替


# 福島第一原子力発電所3号機の状況 (3月29日 12:00現在)

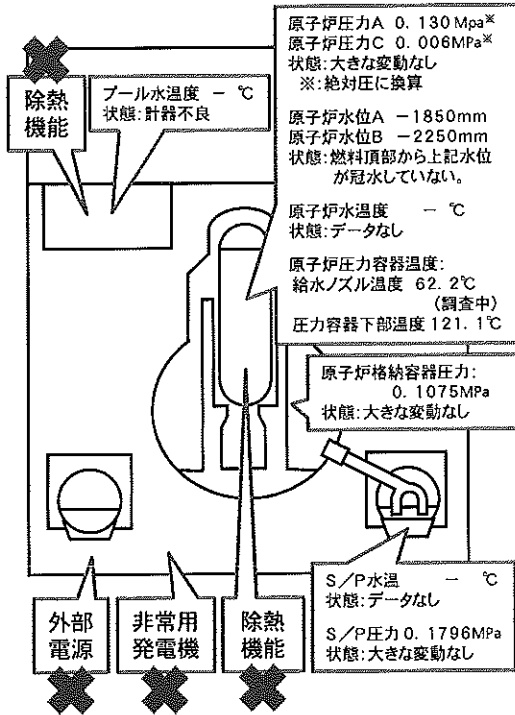

- 発生後の主要なできごと**
- 11日14:46 運転中、地震により自動停止
  - 11日15:42 10条通報(全交流電源喪失)
  - 13日05:10 15条事象の発生(非常用炉心冷却装置注水不能)
  - 13日08:41 ベント開始
  - 13日13:12 海水及びボウ酸の炉心注入開始
  - 14日05:20 ベント開始
  - 14日07:44 15条事象の発生(格納容器圧力異常上昇)
  - 14日11:01 爆発音
  - 16日08:30頃 白煙が発生
  - 17日09:48~10:01 自衛隊ヘリによる放水
  - 17日19:05~19:15 警察の高圧放水車による散水
  - 17日19:35~20:09 自衛隊の消防車により放水
  - 18日14時前~14:38 自衛隊消防車6台による地上放水~14:45 米軍消防車1台による地上放水
  - 19日0:30~01:10 東京消防庁ハイパーレスキュー隊放水
  - 19日14:10~20日3:40 東京消防庁ハイパーレスキュー隊放水
  - 20日11:00 格納容器内圧力が上昇(320kPa)。その後、低下。
  - 20日21:36~21日3:58 東京消防庁ハイパーレスキュー隊放水
  - 21日15:55頃 灰色がかつた煙が発生。17:55に煙が収まっていることを確認
  - 22日15:10~16:00 東京消防庁ハイパーレスキュー隊及び大阪市消防局放水
  - 22日22:46 中央制御室の照明復帰
  - 23日11:03-13:20 使用済燃料プール冷却系(FPC)から使用済燃料プール(SFP)に約35tの海水を注水
  - 23日16:20頃 黒煙が発生。23:30頃及び24日4:50に煙の発生が止んでいることを確認。
  - 24日05:35~16:05 FPCからSFPに約120tの海水を注水
  - 25日13:28~16:00 東京消防庁の支援を受けた川崎市消防局による放水
  - 25日18:02 淡水の炉心注入開始
  - 27日12:34~14:36 コンクリートポンプ車による放水
  - 28日20:30 仮設電動ポンプでの炉心注水に切替
  - 29日14:17 コンクリートポンプ車による放水開始(淡水)

現状:  
プールへの海水注入及び炉心への淡水注入を継続


# 福島第一原子力発電所4号機の状況 (3月29日 12:00現在)

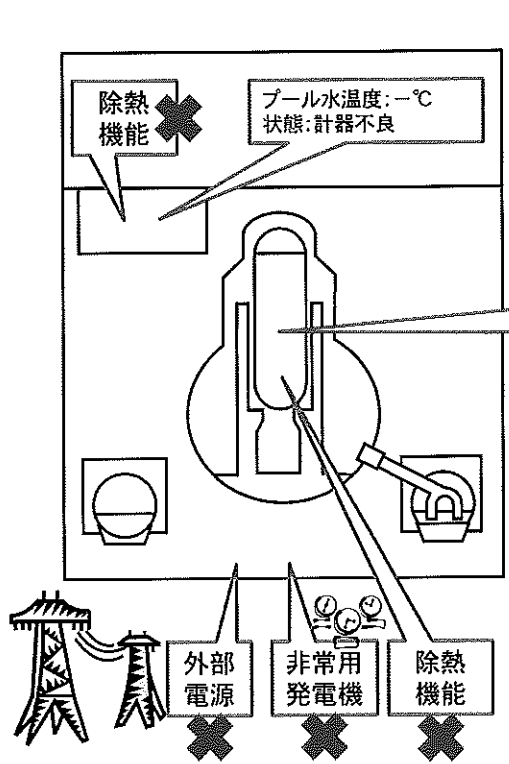

- 発生後の主要なできごと**
- 地震発生時、定期検査により停止中
  - 14日04:08 使用済燃料プール温度84℃
  - 15日06:14 4Fの壁が一部破損の確認
  - 15日09:38 3階部分で火災(12:25鎮火)
  - 16日05:45 4号機で火災。事業者によると現場での火は確認できず(06:15)
  - 20日08:21~9:40 自衛隊による使用済燃料プール(SFP)への放水
  - 20日18:30頃 ~ 19:46 自衛隊によるSFPへの放水
  - 21日06:37~08:41 自衛隊によるSFPへの放水
  - 21日15:00頃 パワーセンターまでのケーブル敷設完了
  - 22日10:35 パワーセンター受電
  - 22日17:17~20:32 コンクリートポンプ車による放水
  - 23日10:00~13:02 コンクリートポンプ車による放水
  - 24日14:36~17:30 コンクリートポンプ車による放水
  - 25日06:05~10:20 使用済燃料プール冷却系(FPC)からSFPに海水を注水
  - 25日19:05~22:07 コンクリートポンプ車による放水
  - 27日16:55~19:25 コンクリートポンプ車による放水
  - 29日11:50 中央制御室の照明復帰

現状:原子炉圧力容器に燃料体が存在しない  
プールへの海水注入を継続

## 福島第一原子力発電所5号機の状況 (3月29日 12:00現在)

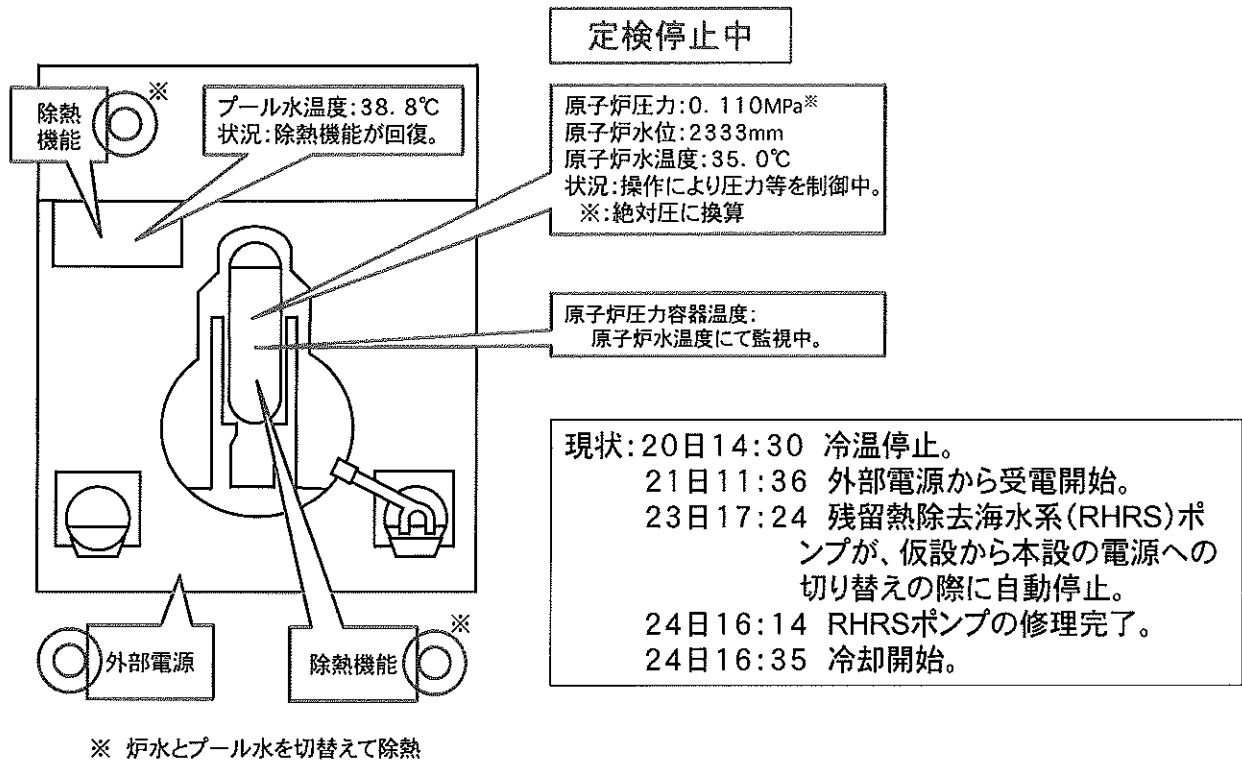

## 福島第一原子力発電所6号機の状況 (3月29日 12:00現在)

